

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).  
 Część 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915, długość ok. 13,015 km.


**ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU  
 STAN NA DZIEŃ 31.08.2019 - WG WYDANYCH PŚP**

Inżynier: MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tamów, NIP: 734-24-80-395  
 Wykonawca: BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa



Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21

**PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - KOSZTY OGÓLNE, DOKUMENTY WYKONAWCY, ROBOTY**

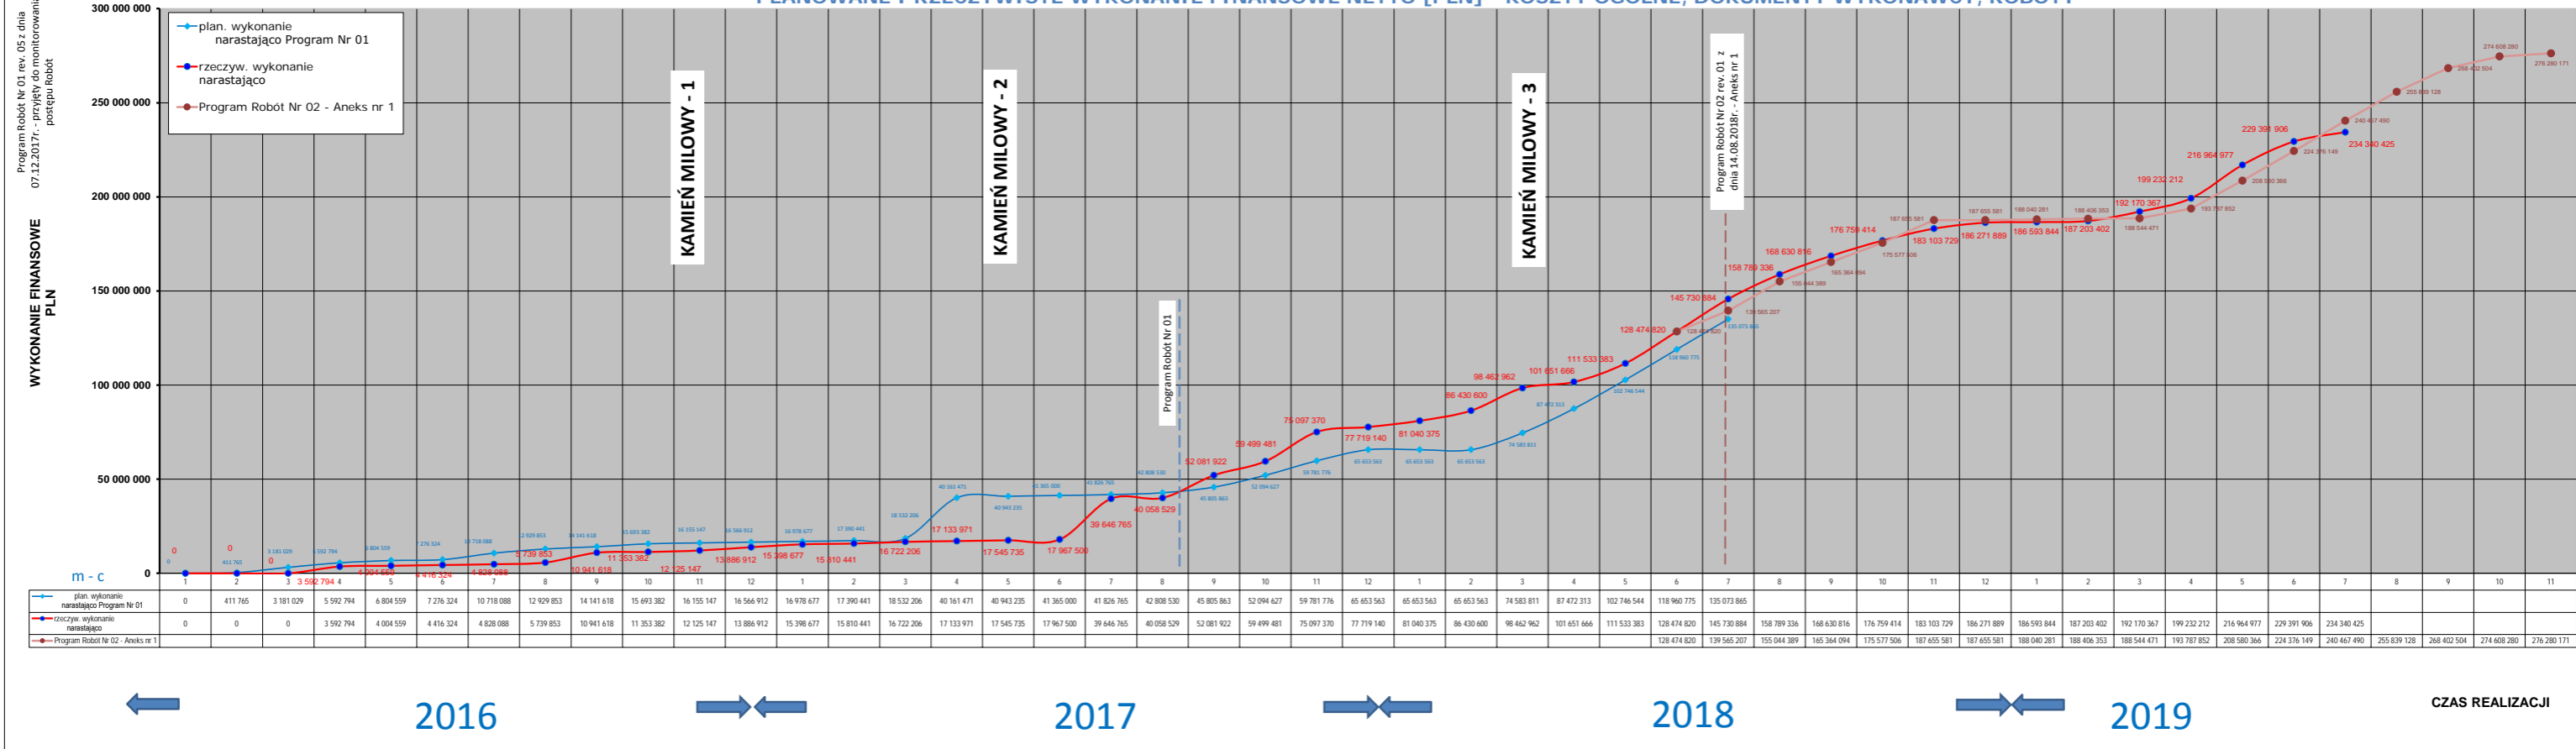

Legenda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
plan, wykonanie narastająco Program Nr 01	0	411 765	3 181 029	5 592 794	6 804 559	7 276 324	10 718 088	12 929 853	14 141 618	15 693 382	16 155 147	16 566 912	16 978 677	17 390 441	18 532 206	40 161 471	40 943 235	41 365 000	41 826 765	42 808 530	45 805 863	52 094 627	59 781 776	65 653 563	65 653 563	65 653 563	74 583 811	87 472 313	102 746 544	118 960 775	135 073 865	128 474 820	145 730 884	158 789 336	168 630 816	176 759 414	183 103 729	186 271 889	186 593 844	187 203 402	192 170 367	199 232 212	214 964 977	229 391 906	234 340 425	255 839 128	268 402 504	274 608 280	276 280 171
rzeczyw. wykonanie narastająco	0	0	0	3 592 794	4 004 559	4 416 324	4 828 088	5 739 853	10 941 618	11 353 382	12 125 147	13 886 912	15 398 677	15 810 441	16 722 206	17 133 971	17 545 735	17 967 500	39 646 765	40 058 529	42 081 922	59 499 481	75 097 370	77 719 140	81 040 375	86 430 600	96 462 962	101 651 666	111 533 383	128 474 820	145 730 884	158 789 336	168 630 816	176 759 414	183 103 729	186 271 889	186 593 844	187 203 402	192 170 367	199 232 212	214 964 977	229 391 906	234 340 425	255 839 128	268 402 504	274 608 280	276 280 171		
Program Roboty Nr 02 - Aneks nr 1	0	0	0	3 592 794	4 004 559	4 416 324	4 828 088	5 739 853	10 941 618	11 353 382	12 125 147	13 886 912	15 398 677	15 810 441	16 722 206	17 133 971	17 545 735	17 967 500	39 646 765	40 058 529	42 081 922	59 499 481	75 097 370	77 719 140	81 040 375	86 430 600	96 462 962	101 651 666	111 533 383	128 474 820	145 730 884	158 789 336	168 630 816	176 759 414	183 103 729	186 271 889	186 593 844	187 203 402	192 170 367	199 232 212	214 964 977	229 391 906	234 340 425	255 839 128	268 402 504	274 608 280	276 280 171		

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Wykonanie w m-cu Realizacja płatności	0	411 765	2 769 265	2 411 765	1 211 765	4 717 765	3 441 765	2 211 765	1 211 765	1 561 765	461 765	411 765	411 765	411 765	1 141 765	21 629 265	781 765	421 765	461 765	981 765	2 997 333	6 288 764	7 687 149	5 871 787	0	0	8 930 248	12 888 502	15 274 231	16 214 231	16 113 080	16 380 987	17 907 313	19 116 930	13 042 461	1 833 775	0	0	0	2 873 451	29 511 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
plan, wykonanie miesięcznie Program nr 01	0	411 765	3 181 029	5 592 794	6 804 559	7 276 324	10 718 088	12 929 853	14 141 618	15 693 382	16 155 147	16 566 912	16 978 677	17 390 441	18 532 206	40 161 471	40 943 235	41 365 000	41 826 765	42 808 530	45 805 863	52 094 627	59 781 776	65 653 563	65 653 563	65 653 563	74 583 811	87 472 313	102 746 544	118 960 775	135 073 865	128 474 820	145 730 884	158 789 336	168 630 816	176 759 414	183 103 729	186 271 889	186 593 844	187 203 402	192 170 367	199 232 212	214 964 977	229 391 906	234 340 425	255 839 128	268 402 504	274 608 280	276 280 171									
Plan, wykonanie narastająco Program Nr 01	0	411 765	3 181 029	5 592 794	6 804 559	7 276 324	10 718 088	12 929 853	14 141 618	15 693 382	16 155 147	16 566 912	16 978 677	17 390 441	18 532 206	40 161 471	40 943 235	41 365 000	41 826 765	42 808 530	45 805 863	52 094 627	59 781 776	65 653 563	65 653 563	65 653 563	74 583 811	87 472 313	102 746 544	118 960 775	135 073 865	128 474 820	145 730 884	158 789 336	168 630 816	176 759 414	183 103 729	186 271 889	186 593 844	187 203 402	192 170 367	199 232 212	214 964 977	229 391 906	234 340 425	255 839 128	268 402 504	274 608 280	276 280 171									
Rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	0,00	3 592 794,13	4 117 647,1	4 117 647,1	4 117 647,1	9 117 647,1	5 201 764,71	4 117 647,1	7 717 647,1	1 701 764,71	5 111 764,71	4 117 647,1	9 117 647,1	4 117 647,1	4 217 647,1	21 679 264,71	4 117 647,1	12 023 352,86	7 417 558,07	15 997 866,14	2 621 769,67	3 321 234,37	5 380 225,62	12 032 361,56	3 188 704,39	9 881 716,91	16 941 437,03	17 256 063,54	13 058 452,15	9 841 479,95	8 128 598,01	6 344 315,26	3 168 160,12	3 21 954,49	6 09 558,43	4 868 964,73	7 061 845,83	17 732 764,01	12 426 928,16	4 948 518,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rzeczyw. wykonanie narastająco	0	0	0	3 592 794	4 004 559	4 416 324	4 828 088	5 739 853	10 941 618	11 353 382	12 125 147	13 886 912	15 398 677	15 810 441	16 722 206	17 133 971	17 545 735	17 967 500	39 646 765	40 058 529	42 081 922	59 499 481	75 097 370	77 719 140	81 040 375	86 430 600	96 462 962	101 651 666	111 533 383	128 474 820	145 730 884	158 789 336	168 630 816	176 759 414	183 103 729	186 271 889	186 593 844	187 203 402	192 170 367	199 232 212	214 964 977	229 391 906	234 340 425	255 839 128	268 402 504	274 608 280	276 280 171											
% zaawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	1,70%	1,87%	2,05%	2,43%	4,64%	4,82%	5,14%	5,89%	6,53%	6,71%	7,09%	7,27%	7,44%	7,62%	16,82%	16,99%	22,09%	25,24%	31,85%	32,97%	34,38%	36,66%	41,77%	43,12%	47,31%	54,50%	52,75%	57,47%	61,04%	63,98%	66,27%	67,42%	67,54%	67,76%	69,58%	72,11%	78,53%	83,03%	84,82%	92,03%	102,24%	97,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% wykonania ham. w okresie rozlicz.	0,00%	0,00%	0,00%	148,97%	33,88%	87,28%	11,96%	41,22%	429,27%	26,54%	167,13%	427,86%	367,14%	100,00%	79,86%	1,90%	52,67%	100,00%	4694,87%	41,94%	401,14%	117,95%	202,91%	44,65%	-	-	134,74%	24,74%	64,70%	104,48%	107,09%	79,87%	54,96%	42,52%	48,64%	172,77%	-	-	245,76%	60,09%	5,54%	2,06%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
% wykonania ham. narastająco	0,00%	0,00%	0,00%	64,24%	58,85%	60,69%	45,05%	44,39%	77,37%	72,35%	75,05%	83,82%	90,69%	90,91%	90,23%	42,66%	42,85%	43,44%	94,79%	93,58%	113,70%	114,21%	125,62%	118,38%	123,44%	131,65%	132,02%	116,21%	108,55%	108,00%	107,89%	104,84%	99,56%	93,78%	90,86%	91,59%	91,75%	92,05%	94,50%	96,60%	92,03%	102,24%	97,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

KM-1

KM-2

KM-3
