Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok.km 40+915, dług. ok. 13,015km.

| | |
|---|---|
| Zamawiający | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21 |

# ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU
# STAN NA DZIEŃ 31.07.2019 - WG WYDANYCH PŚP

| | |
|---|---|
| Inżynier | MGGP S.A.<br>ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów<br>NIP: 734-24-80-395 |
| Wykonawca | BUDIMEX S.A.<br>ul. Stawki 40,<br>01-040 Warszawa |

MGGP GRUPA MGGP

budimex

## PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - KOSZTY OGÓLNE, DOKUMENTY WYKONAWCY, ROBOTY

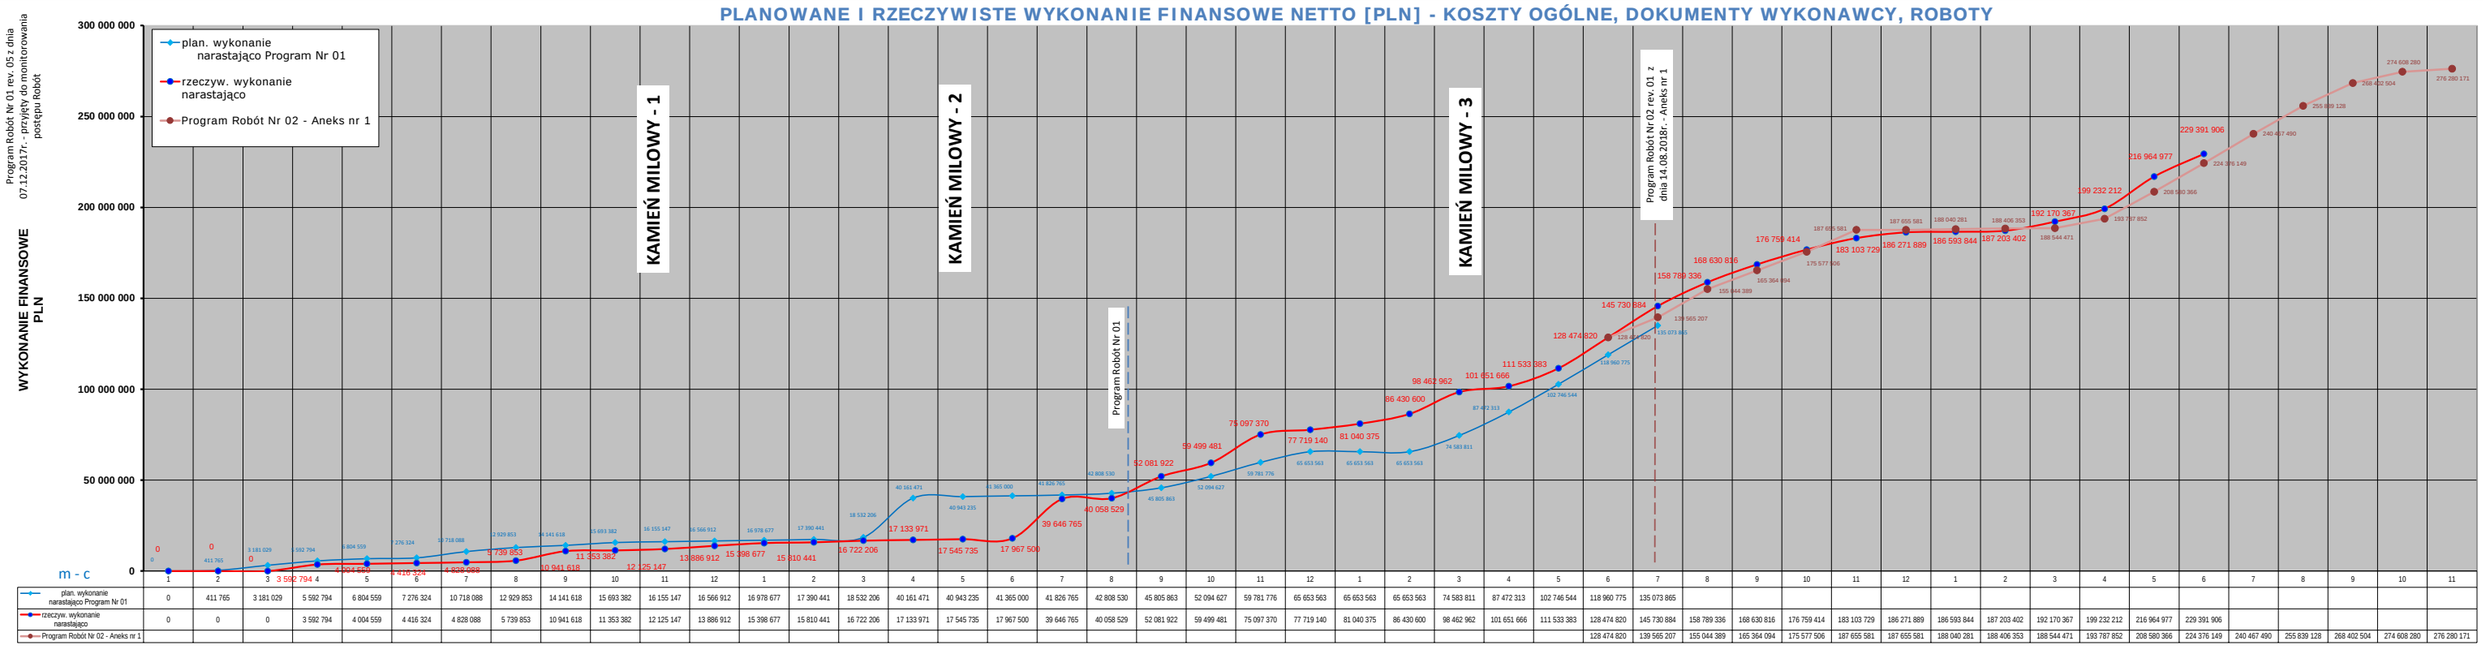


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plan. wykonanie narastająco Program Nr 01 | 0 | 411 765 | 3 181 029 | 5 592 794 | 6 804 559 | 7 276 324 | 10 718 088 | 12 929 853 | 14 141 618 | 15 693 382 | 16 155 147 | 16 566 912 | 16 978 677 | 17 390 441 | 18 532 206 | 40 161 471 | 40 943 235 | 41 365 000 | 41 826 765 | 42 808 530 | 45 805 863 | 52 094 627 | 59 781 776 | 65 653 563 | 65 653 563 | 65 653 563 | 74 583 811 | 87 472 313 | 102 746 544 | 118 960 775 | 135 073 865 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rzeczyw. wykonanie narastająco | 0 | 0 | 0 | 3 592 794 | 4 004 559 | 4 416 324 | 4 828 088 | 5 739 853 | 10 941 618 | 11 353 382 | 12 125 147 | 13 886 912 | 15 398 677 | 15 810 441 | 16 722 206 | 17 133 971 | 17 545 735 | 17 967 500 | 39 646 765 | 40 058 529 | 52 081 922 | 59 499 481 | 75 097 370 | 77 719 140 | 81 040 375 | 86 430 600 | 98 462 962 | 101 651 666 | 111 533 383 | 128 474 820 | 145 730 884 | 158 789 336 | 168 630 816 | 176 759 414 | 183 103 729 | 186 271 889 | 186 593 844 | 187 203 402 | 192 170 367 | 199 232 212 | 216 964 977 | 229 391 906 | | | | | | |
| Program Robót Nr 02 - Aneks nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 474 820 | 139 565 207 | 155 044 389 | 165 364 094 | 175 577 506 | 187 655 581 | 187 655 581 | 188 040 281 | 188 406 353 | 188 544 471 | 193 787 852 | 208 580 366 | 224 376 149 | 240 467 490 | 255 839 128 | 268 402 504 | 274 608 280 | 276 280 171 |



| KWOTY NETTO | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie w m-cu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Realizacja płatności | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| plan. wykonanie miesięcznie Program Nr 01 | 0 | 411 765 | 2 769 265 | 2 411 765 | 1 211 765 | 471 765 | 3 441 765 | 2 211 765 | 1 211 765 | 1 551 765 | 461 765 | 411 765 | 411 765 | 411 765 | 1 141 765 | 21 629 265 | 781 765 | 421 765 | 461 765 | 981 765 | 2 997 333 | 6 288 764 | 7 687 149 | 5 871 787 | 0 | 0 | 8 930 248 | 12 888 502 | 15 274 231 | 16 214 231 | 16 113 090 | 16 390 987 | 17 907 313 | 19 116 930 | 13 042 481 | 1 833 775 | 0 | 0 | 0 | 2 873 451 | 29 511 199 | | | | | | |
| plan. wykonanie narastająco Program Nr 01 | 0 | 411 765 | 3 181 029 | 5 592 794 | 6 804 559 | 7 276 324 | 10 718 088 | 12 929 853 | 14 141 618 | 15 693 382 | 16 155 147 | 16 566 912 | 16 978 677 | 17 390 441 | 18 532 206 | 40 161 471 | 40 943 235 | 41 365 000 | 41 826 765 | 42 808 530 | 45 805 863 | 52 094 627 | 59 781 776 | 65 653 563 | 65 653 563 | 65 653 563 | 74 583 811 | 87 472 313 | 102 746 544 | 118 960 775 | 135 073 865 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Robót Nr 02 - Aneks nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 474 820 | 139 565 207 | 155 044 389 | 165 364 094 | 175 577 506 | 187 655 581 | 187 655 581 | 188 040 281 | 188 406 353 | 188 544 471 | 193 787 852 | 208 580 366 | 224 376 149 | 240 467 490 | 255 839 128 | 268 402 504 | 274 608 280 | 276 280 171 |
| **rzeczyw. wykonanie miesięcznie** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 794,13 | 411 764,71 | 411 764,71 | 411 764,71 | 911 764,71 | 5 201 764,71 | 411 764,71 | 771 764,71 | 1 761 764,71 | 1 511 764,71 | 411 764,71 | 911 764,71 | 411 764,71 | 411 764,71 | 421 764,71 | **21 679 264,71** | 411 764,71 | 12 023 392,89 | 7 417 558,97 | 15 597 889,14 | 2 621 769,67 | 3 321 234,37 | 5 390 225,62 | 12 032 361,50 | 3 188 704,39 | 9 881 716,91 | 16 941 437,03 | 17 256 063,54 | 13 058 452,15 | 9 841 479,95 | 8 128 598,01 | 6 344 315,26 | 3 168 160,12 | 321 954,49 | 609 558,43 | 4 966 964,73 | 7 061 845,83 | 17 732 764,91 | 12 426 928,16 | | | | | | |
| **rzeczyw. wykonanie narastająco** | 0 | 0 | 0 | 3 592 794 | 4 004 559 | 4 416 324 | 4 828 088 | 5 739 853 | 10 941 618 | 11 353 382 | 12 125 147 | 13 886 912 | 15 398 677 | 15 810 441 | 16 722 206 | 17 133 971 | 17 545 735 | 17 967 500 | 39 646 765 | 40 058 529 | 52 081 922 | 59 499 481 | 75 097 370 | 77 719 140 | 81 040 375 | 86 430 600 | 98 462 962 | 101 651 666 | 111 533 383 | 128 474 820 | 145 730 884 | 158 789 336 | 168 630 816 | 176 759 414 | 183 103 729 | 186 271 889 | 186 593 844 | 187 203 402 | 192 170 367 | 199 232 212 | 216 964 977 | 229 391 906 | | | | | | |
| % zaawansowania kontraktu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,52% | 1,70% | 1,87% | 2,05% | 2,43% | 4,64% | 4,82% | 5,14% | 5,89% | 6,53% | 6,71% | 7,09% | 7,27% | 7,44% | 7,62% | 16,82% | 16,99% | 22,09% | 25,24% | 31,85% | 32,97% | 34,38% | 36,66% | 41,77% | 43,12% | 47,31% | 54,50% | 52,75% | 57,47% | 61,04% | 63,98% | 66,27% | 67,42% | 67,54% | 67,76% | 69,56% | 72,11% | 78,53% | 83,03% | | | | | | |
| % wykonania harm. w okresie rozlicz. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 148,97% | 33,98% | 87,28% | 11,96% | 41,22% | 429,27% | 26,54% | 167,13% | 427,86% | 367,14% | 100,00% | 79,86% | 1,90% | 52,67% | 100,00% | 4694,87% | 41,94% | 401,14% | 117,95% | 202,91% | 44,65% | - | - | 134,74% | 24,74% | 64,70% | 104,48% | 107,09% | 79,67% | 54,96% | 42,52% | 48,64% | 172,77% | - | - | - | 245,76% | 60,09% | 5,54% | | | | | | |
| % wykonania harm. narastająco | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **64,24%** | **58,85%** | **60,69%** | **45,05%** | **44,39%** | **77,37%** | **72,35%** | **75,05%** | **83,82%** | **90,69%** | **90,91%** | **90,23%** | 42,66% | 42,85% | 43,44% | 94,79% | 93,58% | 113,70% | 114,21% | 125,62% | 118,38% | 123,44% | 131,65% | 132,02% | 116,21% | 108,55% | 108,00% | 107,89% | 104,84% | 99,56% | 93,78% | 90,86% | 91,59% | 91,75% | 92,05% | 94,50% | 96,60% | 92,03% | 102,24% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ***KM-1*** | | | | | | | ***KM-2*** | | | | | | | | | ***KM-3*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
