Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok.km 40+915, dług. ok. 13,015km.

Zamawiający	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU [%]
STAN NA DZIEŃ 31.08.2019

Inżynier	MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów NIP: 734-24-80-395
Wykonawca	BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

MGGP GRUPA MGGP

budimex

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] - DOKUMENTY WYKONAWCY [do KM-2] ORAZ REALIZACJA ROBÓT [od KM-2]

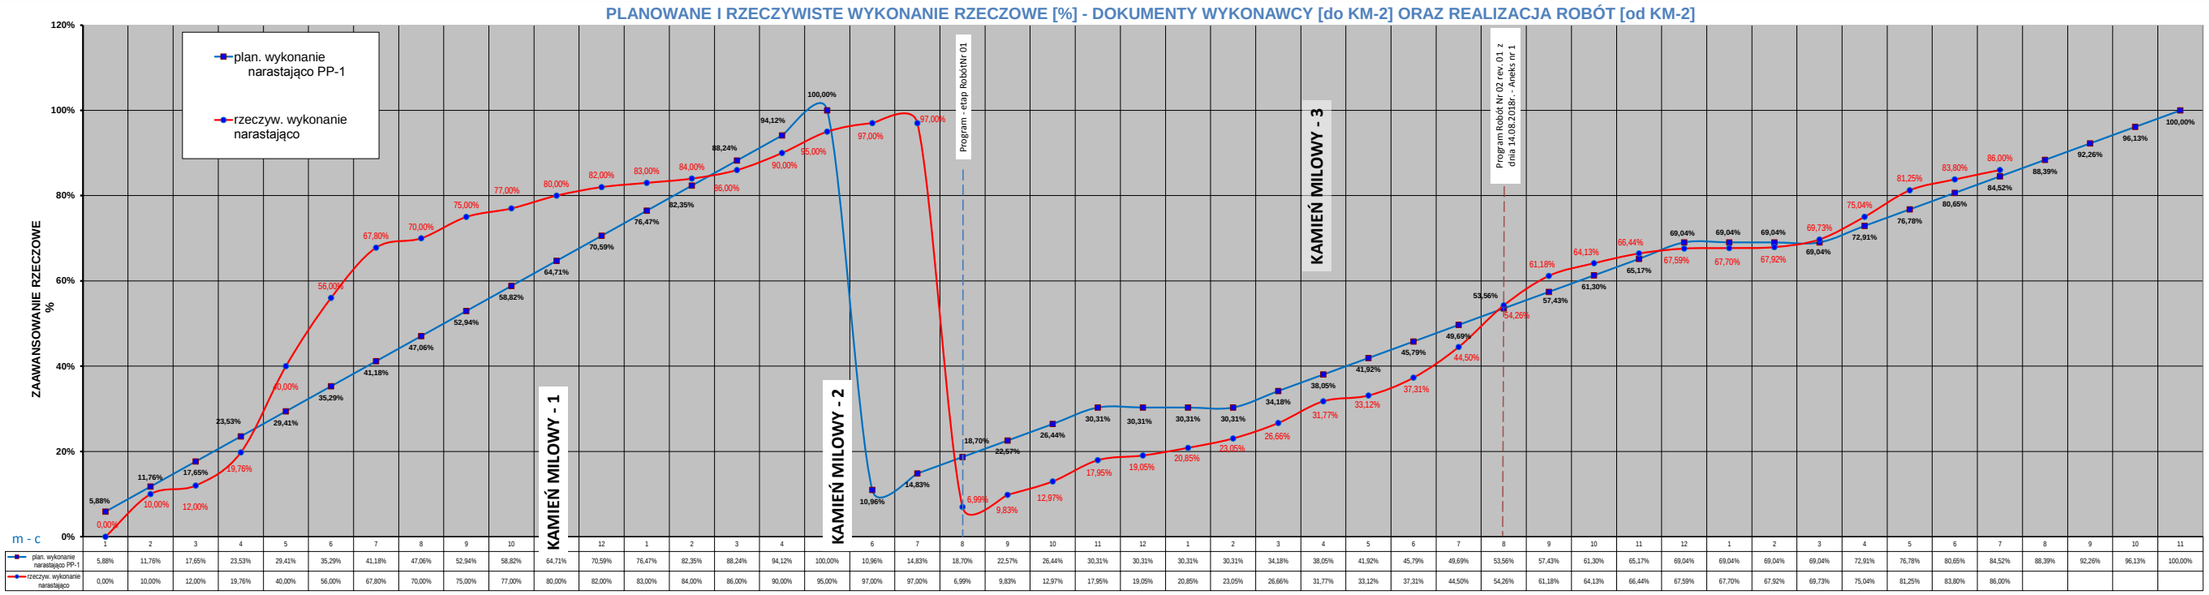

	2016												2017												2018												2019										
m - c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
plan. wykonanie narastająco PP-1	5,88%	11,76%	17,65%	23,53%	29,41%	35,29%	41,18%	47,06%	52,94%	58,82%	64,71%	70,59%	76,47%	82,35%	88,24%	94,12%	100,00%	10,96%	14,83%	18,70%	22,57%	26,44%	30,31%	30,31%	30,31%	30,31%	34,18%	38,05%	41,92%	45,79%	49,69%	53,56%	57,43%	61,30%	65,17%	69,04%	69,04%	69,04%	69,04%	72,91%	76,78%	80,65%	84,52%	88,39%	92,26%	96,13%	100,00%
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00%	10,00%	12,00%	19,76%	40,00%	56,00%	67,80%	70,00%	75,00%	77,00%	80,00%	82,00%	83,00%	84,00%	86,00%	90,00%	95,00%	97,00%	97,00%	6,99%	9,83%	12,97%	17,95%	19,05%	20,85%	23,05%	26,66%	31,77%	33,12%	37,31%	44,50%	54,26%	61,18%	64,13%	66,44%	67,59%	67,70%	67,92%	69,73%	75,04%	81,25%	83,80%	86,00%				

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019										
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,90%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%
plan. wykonanie narastająco PP-1	5,88%	11,76%	17,65%	23,53%	29,41%	35,29%	41,18%	47,06%	52,94%	58,82%	64,71%	70,59%	76,47%	82,35%	88,24%	94,12%	100,00%	10,96%	14,83%	18,70%	22,57%	26,44%	30,31%	30,31%	30,31%	30,31%	34,18%	38,05%	41,92%	45,79%	49,69%	53,56%	57,43%	61,30%	65,17%	69,04%	69,04%	69,04%	69,04%	72,91%	76,78%	80,65%	84,52%	88,39%	92,26%	96,13%	100,00%
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00%	10,00%	2,00%	7,76%	20,24%	16,00%	11,80%	2,20%	5,00%	2,00%	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	2,00%	4,00%	5,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,84%	3,14%	4,98%	1,10%	1,80%	2,20%	3,61%	5,11%	1,35%	4,19%	7,19%	9,76%	6,93%	2,95%	2,30%	1,15%	0,12%	0,22%	1,80%	5,31%	6,21%	2,55%	2,20%				
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00%	10,00%	12,00%	19,76%	40,00%	56,00%	67,80%	70,00%	75,00%	77,00%	80,00%	82,00%	83,00%	84,00%	86,00%	90,00%	95,00%	97,00%	97,00%	6,99%	9,83%	12,97%	17,95%	19,05%	20,85%	23,05%	26,66%	31,77%	33,12%	37,31%	44,50%	54,26%	61,18%	64,13%	66,44%	67,59%	67,70%	67,92%	69,73%	75,04%	81,25%	83,80%	86,00%				
											KM-1												***KM-2***												***KM-3***											
