Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok.km 40+915, dług. ok. 13,015km.

Zamawiający	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU
STAN NA DZIEŃ 31.10.2019 - WG WYDANYCH PŚP

Inżynier	MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów NIP: 734-24-80-395
Wykonawca	BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

MGGP GRUPA MGGP

budimex

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - KOSZTY OGÓLNE, DOKUMENTY WYKONAWCY, ROBOTY

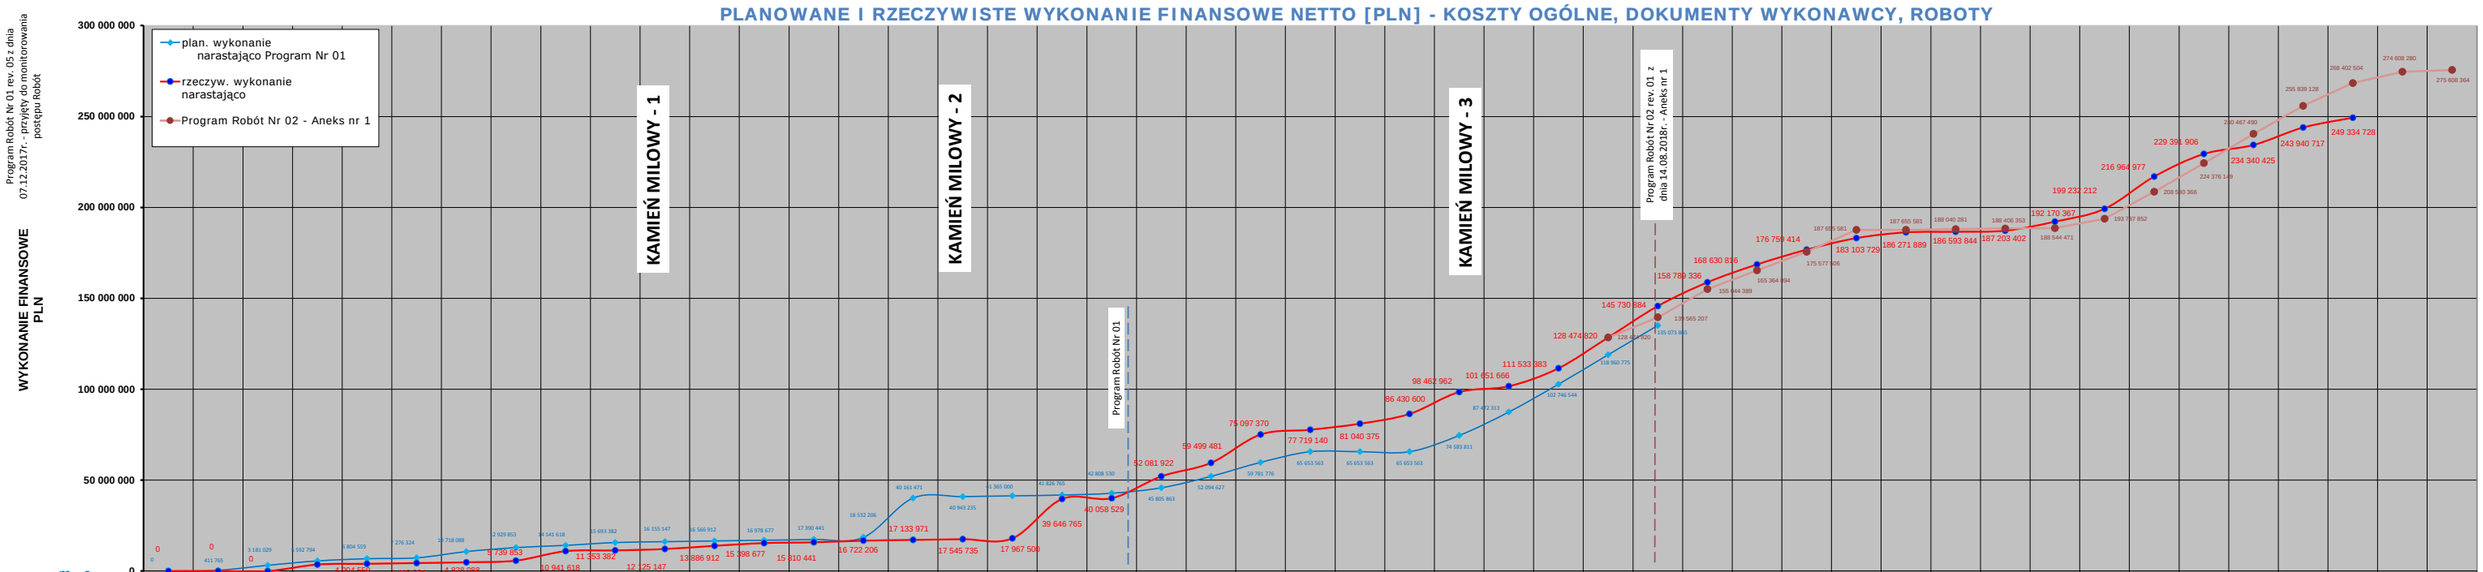

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
plan. wykonanie narastająco Program Nr 01	0	411 765	3 181 029	5 592 794	6 804 559	7 276 324	10 718 088	12 929 853	14 141 618	15 693 382	16 155 147	16 566 912	16 978 677	17 390 441	18 532 206	40 161 471	40 943 235	41 365 000	41 826 765	42 808 530	45 805 863	52 094 627	59 781 776	65 653 563	65 653 563	65 653 563	74 583 811	87 472 313	102 746 544	118 960 775	135 073 865																														
rzeczyw. wykonanie narastająco	0	0	0	3 592 794	4 004 559	4 416 324	4 828 088	5 739 853	10 941 618	11 353 382	12 125 147	13 886 912	15 398 677	15 810 441	16 722 206	17 133 971	17 545 735	17 967 500	39 646 765	40 058 529	52 081 922	59 499 481	75 097 370	77 719 140	81 040 375	86 430 600	98 462 962	101 651 666	111 533 383	128 474 820	145 730 884	158 789 336	168 630 816	176 759 414	183 103 729	186 271 889	186 593 844	187 203 402	192 170 367	199 232 212	216 964 977	229 391 906	234 340 425	243 940 717	249 334 728													
Program Robót Nr 02 - Aneks nr 1																														128 474 820	139 565 207	155 044 389	165 364 094	175 577 506	187 655 581	187 655 581	188 040 281	188 406 353	188 544 471	193 787 852	208 580 366	224 376 149	240 467 490	255 839 128	268 402 504	274 608 280	275 608 364													

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019											
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
plan. wykonanie miesięcznie Program	0	411 765	2 769 265	2 411 765	1 211 765	471 765	3 441 765	2 211 765	1 211 765	1 551 765	461 765	411 765	411 765	411 765	1 141 765	21 629 265	781 765	421 765	461 765	981 765	2 997 333	6 288 764	7 687 149	5 871 787	0	0	8 930 248	12 888 502	15 274 231	16 214 231	16 113 090	16 390 987	17 907 313	19 116 930	13 042 481	1 833 775	0	0	0	2 873 451	29 511 199																			
plan. wykonanie narastająco Program Nr 01	0	411 765	3 181 029	5 592 794	6 804 559	7 276 324	10 718 088	12 929 853	14 141 618	15 693 382	16 155 147	16 566 912	16 978 677	17 390 441	18 532 206	40 161 471	40 943 235	41 365 000	41 826 765	42 808 530	45 805 863	52 094 627	59 781 776	65 653 563	65 653 563	65 653 563	74 583 811	87 472 313	102 746 544	118 960 775	135 073 865																														
Program Robót Nr 02 - Aneks nr 1																														128 474 820	139 565 207	155 044 389	165 364 094	175 577 506	187 655 581	187 655 581	188 040 281	188 406 353	188 544 471	193 787 852	208 580 366	224 376 149	240 467 490	255 839 128	268 402 504	274 608 280	275 608 364													
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	0,00	3 592 794,13	411 764,71	411 764,71	411 764,71	911 764,71	5 201 764,71	411 764,71	771 764,71	1 761 764,71	1 511 764,71	411 764,71	911 764,71	411 764,71	411 764,71	421 764,71	**21 679 264,71**	411 764,71	12 023 392,89	7 417 558,97	15 597 889,14	2 621 769,67	3 321 234,37	5 390 225,62	12 032 361,50	3 188 704,39	9 881 716,91	16 941 437,03	17 256 063,54	13 058 452,15	9 841 479,95	8 128 598,01	6 344 315,26	3 168 160,12	321 954,49	609 558,43	4 966 964,73	7 061 845,83	17 732 764,91	12 426 928,16	4 948 518,96	9 600 292,91	5 394 010,53													
rzeczyw. wykonanie narastająco	0	0	0	3 592 794	4 004 559	4 416 324	4 828 088	5 739 853	10 941 618	11 353 382	12 125 147	13 886 912	15 398 677	15 810 441	16 722 206	17 133 971	17 545 735	17 967 500	39 646 765	40 058 529	52 081 922	59 499 481	75 097 370	77 719 140	81 040 375	86 430 600	98 462 962	101 651 666	111 533 383	128 474 820	145 730 884	158 789 336	168 630 816	176 759 414	183 103 729	186 271 889	186 593 844	187 203 402	192 170 367	199 232 212	216 964 977	229 391 906	234 340 425	243 940 717	249 334 728													
% zaawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%	1,70%	1,87%	2,05%	2,43%	4,64%	4,82%	5,14%	5,89%	6,53%	6,71%	7,09%	7,27%	7,44%	7,62%	16,82%	16,99%	22,09%	25,24%	31,85%	32,97%	34,38%	36,66%	41,77%	43,12%	47,31%	54,50%	52,88%	57,61%	61,18%	64,13%	66,44%	67,59%	67,70%	67,92%	69,73%	72,29%	78,72%	83,23%	85,03%	88,51%	90,47%													
% wykonania harm. w okresie rozlicz.	0,00%	0,00%	0,00%	148,97%	33,98%	87,28%	11,96%	41,22%	429,27%	26,54%	167,13%	427,86%	367,14%	100,00%	79,86%	1,90%	52,67%	100,00%	4694,87%	41,94%	401,14%	117,95%	202,91%	44,65%	-	-	134,74%	24,74%	64,70%	104,48%	107,09%	79,67%	54,96%	42,52%	48,64%	172,77%	-	-	-	245,76%	60,09%	5,54%	2,06%	3,75%	2,01%													
% wykonania harm. narastająco	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**64,24%**	**58,85%**	**60,69%**	**45,05%**	**44,39%**	**77,37%**	**72,35%**	**75,05%**	**83,82%**	**90,69%**	**90,91%**	**90,23%**	42,66%	42,85%	43,44%	94,79%	93,58%	113,70%	114,21%	125,62%	118,38%	123,44%	131,65%	132,02%	116,21%	108,55%	108,00%	107,89%	104,84%	99,56%	93,78%	90,86%	91,59%	91,75%	92,05%	94,50%	96,60%	92,03%	102,24%	97,45%	95,35%	92,90%													
											KM-1							***KM-2***										***KM-3***																													
